Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	**Vertragliches**	**190 Tage**	**Don 21.05.15**	**Die 09.02.16**	
2	Beauftragung	1 Tag	Don 21.05.15	Don 21.05.15	
3	Einholung Genehmigungen	1 Tag	Fre 22.05.15	Fre 22.05.15	2
4	Einkauf	1 Tag	Fre 22.05.15	Fre 22.05.15	2
5	Bauzeit Ausschreibung	190 Tage	Don 21.05.15	Die 09.02.16	
6	Bauzeit - Überschneidung 1.,2. & 3. BA	**152 Tage**	Don 21.05.15	Don 17.12.15	
7	Abnahme	1 Tag	Fre 18.12.15	Fre 18.12.15	6
8	**Bauausführung**	**149 Tage**	**Die 26.05.15**	**Don 17.12.15**	
9	Fertigstellung Poststraße	1 Tag	Sam 30.05.15	Sam 30.05.15	
10	Rückbau Verkehrseinengung Hotel Hübner	6 Tage	Die 26.05.15	Mon 01.06.15	
11	Herstellung Provisorische Haltestelle	2 Tage	Mon 01.06.15	Die 02.06.15	
12	**1. Bauabschnitt**	**80 Tage**	**Mon 01.06.15**	**Fre 18.09.15**	
13	Baustelleneinrichtung	5 Tage	Mon 01.06.15	Fre 05.06.15	9
14	Aufstellung Vollsperrung	1 Tag	Die 02.06.15	Die 02.06.15	10
15	Oberflächenaufbruch Fahrbahn	1 Tag	Die 02.06.15	Die 02.06.15	10
16	Herstellung RW/SW/TW	23 Tage	Mit 03.06.15	Fre 03.07.15	15
17	Herstellung Fahrbahn	30 Tage	Mon 06.07.15	Fre 14.08.15	16
18	Herstellung Nebenanlagen	25 Tage	Mon 17.08.15	Fre 18.09.15	17
19	**2. Bauabschnitt**	**119 Tage**	**Mon 06.07.15**	**Don 17.12.15**	
20	Aufstellung Vollsperrung	1 Tag	Mon 06.07.15	Mon 06.07.15	16
21	Oberflächenaufbruch Fahrbahn	1 Tag	Mon 06.07.15	Mon 06.07.15	16
22	Herstellung RW/SW/TW	49 Tage	Die 07.07.15	Fre 11.09.15	21
23	Herstellung Fahrbahn	**30 Tage**	Mon 14.09.15	Fre 23.10.15	22
24	Herstellung Nebenanlagen	**39 Tage**	Mon 26.10.15	Don 17.12.15	23
25	**3. Bauabschnitt + Kreuzung Heinrich Heine Straße**	**32 Tage**	**Mon 14.09.15**	**Die 27.10.15**	
26	Aufstellung Vollsperrung	1 Tag	Mon 14.09.15	Mon 14.09.15	22
27	Oberflächenaufbruch Fahrbahn	1 Tag	Die 15.09.15	Die 15.09.15	26
28	Herstellung RW/SW/TW	10 Tage	Mit 16.09.15	Die 29.09.15	27
29	Herstellung Fahrbahn	10 Tage	Mit 30.09.15	Die 13.10.15	28
30	Herstellung Nebenanlagen	**10 Tage**	Mit 14.10.15	Die 27.10.15	29
31	**Zahlungsplan netto**	**194 Tage**	**Fre 05.06.15**	**Mit 02.03.16**	

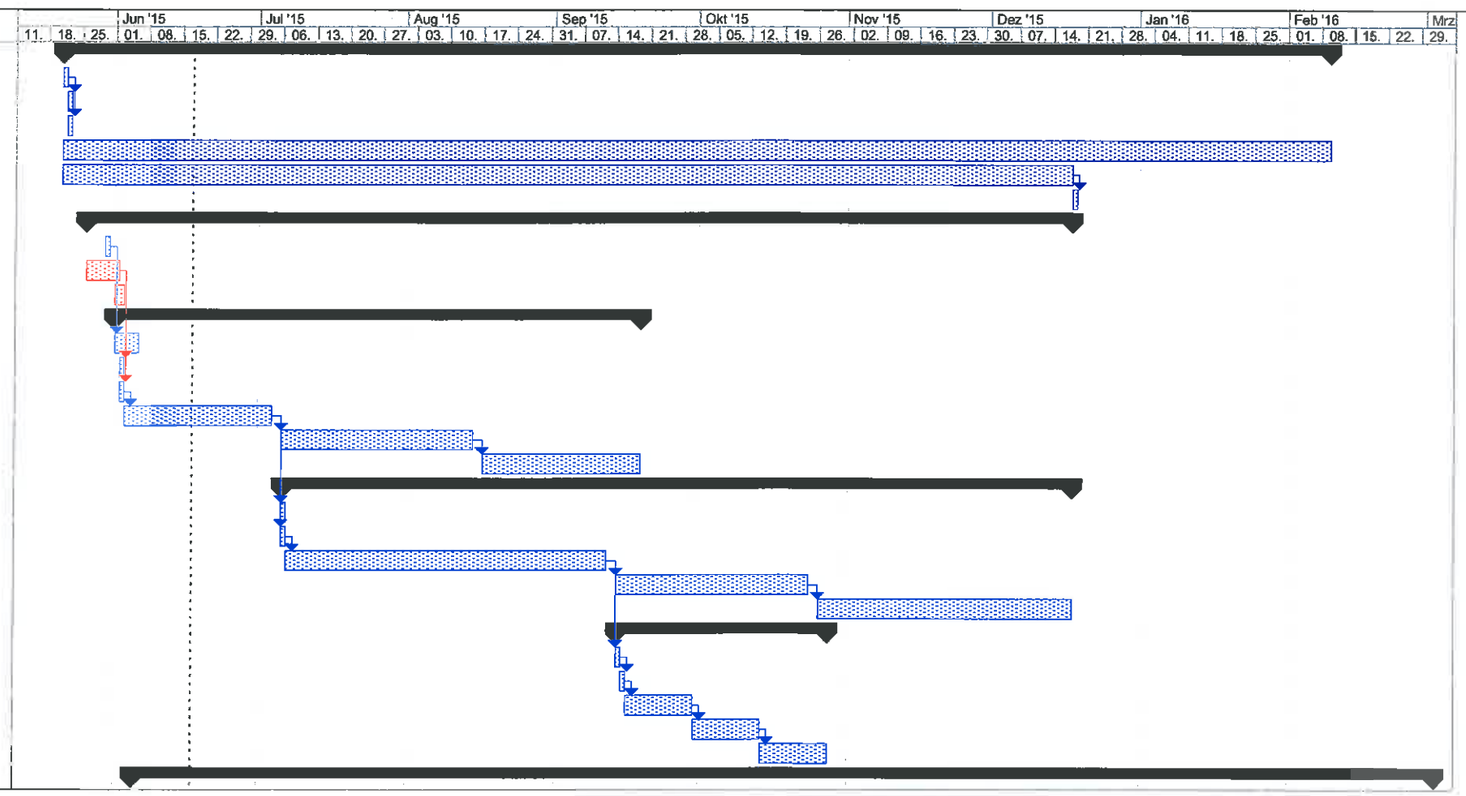

BAU
GmbH
An der B 109 · 18233 Neubukow
Tel. 038293 7160 · Fax 71589
10/06/16
